

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO
CONTRATO Nº 851612001101 QUE,
ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS E O CONSÓRCIO
CST LINHA 13 - JADE - LOTE 02.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro o **CONSÓRCIO CST LINHA 13 - JADE - LOTE 02**, CNPJ nº 18.885.708/0001-32, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.656, 4º andar, Conj. 41/42, Jardim Paulistano, composto pelas empresas **CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., SERVENG-CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA** e **TIISA - INFRA-ESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A.**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 02**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Legislação Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

1.1.1 a prorrogação do prazo de execução contratual em 03 (três) meses, com a readequação do cronograma físico-financeiro, conforme Cronograma Físico-Financeiro - Anexo 1; e

1.1.2 a alteração da redação do subitem 17.1.6, do Contrato, que passará a vigorar conforme a seguir:

"17.1.6 Multa de 0,015% (quinze milésimos por cento) por dia, calculado sobre o valor total do contrato, no caso de atraso na conclusão dos serviços ou fornecimentos, individualmente, dos seguintes eventos:

- a) Via Permanente - Elevado - Fundações, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total concluídos em até 35 (trinta e cinco) meses da emissão da Ordem de Serviço.

- b) Via Permanente - Elevado - Fundações, atividade que deverá ser concluída em até 61 (sessenta e um) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- c) Via Permanente - Elevado - Mesoestruturas, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total concluídos em até 40 (quarenta) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- d) Via Permanente - Elevado - Mesoestruturas, atividade que deverá ser concluída em até 61 (sessenta e um) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- e) Via Permanente - Elevado - Estruturas, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total concluídos em até 43 (quarenta e três) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- f) Via Permanente - Elevado - Estruturas, atividade que deverá ser concluída em até 61 (sessenta e um) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- g) Via Permanente - Serviços de Superestrutura, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total concluídos em até 51 (cinquenta e um) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- h) Via Permanente - Serviços de Superestrutura, atividade que deverá ser concluída em até 65 (sessenta e cinco) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- i) Via Permanente - Execução de Laje de Regularização, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total concluídos em até 43 (quarenta e três) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- j) Via Permanente - Execução de Laje de Regularização, atividade que deverá ser concluída em até 54 (cinquenta e quatro) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- k) Via Permanente - Execução de Laje Fixa para fixação direta, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total concluídos em até 49 (quarenta e nove) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- l) Via Permanente - Execução de Laje Fixa para fixação direta, atividade que deverá ser concluída em até 54 (cinquenta e quatro) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- m) Execução de Laje Flutuante do Sistema de Atenuação, atividade que deverá ser concluída em até 54 (cinquenta e quatro) meses da emissão da Ordem de Serviço.

- n) Rede Aérea - Implantação de Rede Aérea e Circuitos Auxiliares de Alimentação, atividade que deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total concluídos em até 56 (cinquenta e seis) meses da emissão da Ordem de Serviço.
- o) Rede Aérea - Implantação de Rede Aérea e Circuitos Auxiliares de Alimentação, atividade que deverá ser concluída em até 62 (sessenta e dois) meses da emissão da Ordem de Serviço.”.

2 VALOR

2.1 O presente Termo de Aditamento não implica em acréscimo do valor contratual.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 851612001101 e dos Termos de Aditamento nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 15 de FEVEREIRO de 2019

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:




RODRIGO SERGIO DIAS
Diretor Administrativo e Financeiro
rodrigo.dias@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 225.510.368-01
RG nº: 39.561.246-9



PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4



DIOGO PERES NETO
Diretor de Planejamento
diogo.neto@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº: 286.454.178-55
RG nº: 26.859.571-9




MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 025.077.968-47
RG nº: 4.621.958-4



JACKSON TEIXEIRA EUGÊNIO
Gestor
jackson.eugenio@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 117.329.466-04
RG nº: 52.876.169-9

Pelo **CONSÓRCIO CST LINHA 13 - JADE - LOTE 02:**

ALBERTO MAYER DOUEK
Representante Legal do Consórcio
albertodouek@consbem.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 073.062.738-17
RG Nº: 10.314.971-5



THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO
Representante Legal do Consórcio
secretaria.presidente@serveng.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 006.249.538-07
RG Nº: 3.837.244-7





RICARDO BELLON JUNIOR
Representante Legal do Consórcio
ricardo.bellon@tiisa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 588.370.437-91
RG Nº: 04.545.559-9



JUAREZ BARCELLOS FILHO
Representante Legal do Consórcio
juarez.barcellos@tiisa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 667.117.387-72
RG Nº: 4002292

TESTEMUNHAS:

1) 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente de Administração
e Gestão

2) 
Mº Marcelo de Almeida
Analista de Adm. e Gestão

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2

TERMO ADITIVO NR 7

CONTRATADA: CONSORCIO CST LINHA 13 JADE - LOTE 2 - CONTRATO Nº 851 612 001 101

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
	LOTE 2																
1	CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS	-	-	389,83	1.510.185,84	1.492.253,71	1.169,49	2.728,80	17.147,58	8.186,42	514.180,54	8.966,06	30.405,66	49.118,44	63.931,94	789.397,86	35.084,60
2	CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS - 2 CANTEIROS	-	-	-	-	-	9.685,58	205.829,13	1.033.363,58	128.234,27	1.215.424,75	251.356,45	241.181,42	450.770,85	119.175,12	87.030,18	12.225,14
3	SISTEMAS ELETRÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	SUBSISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DE OBRAS ON-LINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PLANO DE COMISSIONAMENTO - ENTREGA E APROVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMISSIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE	-	18.294,63	15.614,97	31.985,39	-	64.730,45	10.744,00	45.598,39	51.060,86	81.180,35	99.091,91	152.861,76	211.359,80	316.038,95	207.931,32	183.648,69
4.3	MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E EFLUENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	MANEJO DE VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	2.148,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	PLANTIO COMPENSATÓRIO E MANUTENÇÃO, INCLUSIVE RELATÓRIOS	-	-	-	-	-	17.291,04	-	-	-	-	-	-	222.912,77	-	45.962,83	-
5	VIA PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	VIA PERMANENTE - ELEVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	FUNDAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	493.537,18	531.450,12	392.250,41	2.047.643,70	2.879.798,38	3.508.697,77	1.698.324,81	1.400.165,84
5.1.3	MESOESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	362.962,88	6.103,55	1.090.854,45	-	125.262,73	378.368,95	588.081,69	267.552,62	560.237,19
5.1.4	ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867.660,10	581.881,53	808.053,59
5.1.5	ISOLAMENTO ACÚSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.714,93	2.389,14	1.702,42	564,20	-	-	-
5.1.7	BANDEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	VIA PERMANENTE - SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	VIA PERMANENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	EXECUÇÃO DE LAJE DE REGULARIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,00	-	2.173,54	1.894,38	2.306,12
5.2.4	EXECUÇÃO DE LAJE FIXA PARA FIXAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	EXECUÇÃO DE LAJE FLUTUANTE DO SISTEMA DE ATENUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REDE AÉREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FIOS E CABOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	TESTES - ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MENSAL	0,00	18.294,63	16.004,80	1.542.181,23	1.492.253,71	92.876,56	219.301,93	1.461.221,23	687.122,28	3.451.805,14	754.053,97	2.599.531,69	4.194.642,59	5.466.759,11	3.679.975,53	3.001.721,17
	TOTAL ACUMULADO	0,00	18.294,63	34.299,43	1.576.480,66	3.068.734,37	3.161.610,93	3.380.912,86	4.842.134,09	5.529.256,37	8.981.061,51	9.735.115,48	12.334.647,17	16.529.289,76	21.996.048,87	25.676.024,40	28.677.745,57

Jackson Teixeira Eugênio
Gerente de Obras Cíveis
Expansão Linha - 13

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2

TERMO ADITIVO NR 7

CONTRATADA: CONSORCIO CST LINHA 13 JADE - LOTE 2 - CONTRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

		MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32
	DESCRIÇÃO																
	LOTE 2																
1	CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS	18.321,96	53.796,99	69.779,36	92.779,26	96.677,65	132.541,80	108.762,26	116.779,47	478.317,23	118.897,81	51.457,41	44.830,33	96.677,65	437.395,19	90.050,48	107.982,61
2	CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS - 2 CANTEIROS	30.116,75	156.617,39	1.467.101,37	290.783,77	544.353,32	282.047,28	499.578,44	41.333,76	52.666,91	555.003,25	907.974,58	194.252,42	437.054,68	88.866,57	180.428,83	401.866,97
3	SISTEMAS ELETRÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	SUBSISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DE OBRAS ON-LINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	14.322,11	-	-	44.731,42	55.469,58	-	34.904,00	-	-	26.176,00	-	76.148,31	48.710,06	264.772,80	6.936,10	108.788,78
	PLANO DE COMISSONAMENTO - ENTREGA E APROVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMISSONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE	208.871,42	175.827,66	255.514,07	238.546,61	108.541,86	383.083,38	69.283,76	172.604,63	87.879,47	177.823,49	156.714,76	62.745,81	395.073,94	257.764,95	641.570,70	48.537,45
4.3	MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E EFLUENTES	-	547.437,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	MANEJO DE VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS	-	-	-	-	5.155,72	-	387.227,66	108.087,28	452.591,45	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	PLANTIO COMPENSATÓRIO E MANUTENÇÃO, INCLUSIVE RELATÓRIOS	2.686,00	-	-	-	1.509,48	-	1.047,45	-	-	-	-	-	3.641,86	97.716,45	-	-
5	VIA PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	VIA PERMANENTE - ELEVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	FUNDAÇÕES	491.172,40	412.713,81	1.463.848,25	2.790.352,44	2.592.041,01	1.680.911,11	1.586.120,12	2.038.155,81	1.712.679,04	387.673,79	208.248,98	896.341,67	1.631.768,26	781.202,46	1.694.919,90	3.380.309,40
5.1.3	MESOESTRUTURAS	334.858,71	1.314.334,35	1.093.982,99	540.484,33	628.123,00	3.815.890,86	1.154.643,85	1.686.382,92	946.863,28	357.580,37	1.014.379,54	640.486,87	954.178,24	589.983,46	574.785,76	685.978,64
5.1.4	ESTRUTURAS	470.166,05	1.921.406,17	1.615.638,59	3.918.113,30	4.220.648,42	5.018.040,33	5.445.149,34	5.713.741,17	5.570.774,58	8.500.716,95	2.047.030,17	1.604.356,84	5.070.341,63	3.417.034,21	5.450.346,48	6.079.741,00
5.1.5	ISOLAMENTO ACÚSTICO	-	-	-	-	-	3.435,20	10.305,60	13.740,80	44.657,60	17.176,00	3.435,20	45.796,64	-	28.498,60	9.184,64	23.485,92
5.1.6	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7	BANDEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	VIA PERMANENTE - SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	VIA PERMANENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAS	1.473,69	2.509,28	-	5.837,98	-	-	-	-	-	-	-	256.814,91	-	-	165.357,76	39.600,68
5.2.3	EXECUÇÃO DE LAJE DE REGULARIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	EXECUÇÃO DE LAJE FIXA PARA FIXAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	EXECUÇÃO DE LAJE FLUTUANTE DO SISTEMA DE ATENUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REDE AÉREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FIOS E CABOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	TESTES - ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL MENSAL	1.571.988,99	4.584.642,67	5.965.764,63	7.921.629,11	8.250.519,93	11.315.949,96	9.277.022,48	9.895.835,32	9.346.329,56	10.141.149,66	4.389.240,64	3.821.773,80	9.758.523,14	6.498.208,48	9.087.264,95	10.915.483,31
	TOTAL ACUMULADO	30.249.734,56	34.834.377,23	40.800.141,86	48.721.770,97	56.972.290,90	68.288.240,86	77.565.263,34	87.461.098,66	96.807.428,22	106.948.577,88	111.337.818,52	115.159.592,32	124.918.115,46	131.416.323,94	140.503.588,89	151.419.072,20

Jackson Teixeira Eugênio
Gerente de Obras Cíveis
Expansão Linha - 13

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2
TERMO ADITIVO NR 7
 CONTRATADA: CONSORCIO CST LINHA 13 JADE - LOTE 2 - CONTRA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A
 IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO
 GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

		MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	MÊS 61	MÊS 62	MÊS 63	MÊS 64
	LOTE 2																
1	CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS	313.422,10	464.314,82	378.918,52	241.409,46	375.274,28	178.996,02	500.410,26	39.502,67	17.282,40	952.239,26	18.495,20	31.706,10	155.889,86	54.142,89	54.142,89	
2	CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS - 2 CANTEIROS	-	-	-	-	1.201,70	5.486,88	367.411,20	-	-	19.518,60	-	4.087,30	5.416,43	3.805,76	-	
3	SISTEMAS ELETRÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	SUBSISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DE OBRAS ON-LINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	-	-	-	-	790.633,93	837.696,95	-	-	-	32.107,40	-	-	-	275.559,64	-	
	PLANO DE COMISSIONAMENTO - ENTREGA E APROVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	COMISSIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE	93.232,20	136.501,00	91.836,94	-	242.938,35	62.166,71	125.442,99	217.759,20	-	26.037,21	-	90.531,72	11.002,52	51.519,20	-	
4.3	MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1	REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E EFLUENTES	-	-	-	-	-	-	-	7.375,22	-	1.614,99	-	-	-	-	-	
4.3.2	MANEJO DE VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS	19.422,60	8.347,48	-	-	11.490,71	-	-	6.388,99	-	-	-	1.074,39	-	-	-	
4.3.3	PLANTIO COMPENSATÓRIO E MANUTENÇÃO, INCLUSIVE RELATÓRIOS	2.686,00	13.023,60	-	-	15.578,80	43.128,65	-	23.732,40	-	832,66	-	11.911,90	7.160,38	9.531,14	-	
5	VIA PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	VIA PERMANENTE - ELEVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	137.661,51	84.523,68	18.140,20	850.438,61	582.301,71	5.223,87	119.395,75	-	168.389,45	68.416,06	115.010,84	74.067,61	-	-	
5.1.2	FUNDAÇÕES	74.775,07	-	-	-	-	-	344.769,33	-	-	-	116,26	-	-	-	-	
5.1.3	MESOESTRUTURAS	661.237,57	450.923,12	71.552,47	-	482.005,81	43.781,25	788.484,23	273.952,69	217.508,80	54.969,92	74.048,94	355,33	413,05	-	-	
5.1.4	ESTRUTURAS	5.203.451,09	10.922.655,91	11.085.846,01	4.057.216,72	2.449.865,89	2.691.572,60	1.273.338,00	-	-	-	-	357.047,73	-	482.894,08	-	
5.1.5	ISOLAMENTO ACÚSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.6	DRENAGEM	924,50	9.534,75	582,83	70.319,02	1.257.357,13	581.219,69	859.740,53	355.701,16	52.073,66	35.775,76	2.178,18	38.411,76	145.445,70	152.368,96	-	
5.1.7	BANDEJAMENTO	57.861,62	887.139,20	385.429,25	1.827.088,70	774.563,02	227.787,11	160.329,70	-	-	1.601.112,72	35.268,80	-	-	392.612,51	-	
5.2	VIA PERMANENTE - SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.1	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	1.901.185,03	976.765,78	653.190,60	136.089,15	2.041.202,60	114.130,28	75.731,46	170.717,90	16.189,04	106.008,69	1.642,56	128.906,39	-	290.489,24	290.489,24	
5.2.2	VIA PERMANENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAS	82.576,22	395.898,02	73,70	247.677,13	122.748,86	44.048,37	-	7.616,16	-	-	-	-	6.348,09	3.174,04	-	
5.2.3	EXECUÇÃO DE LAJE DE REGULARIZAÇÃO	6.738,90	8.294,03	1.555,13	2.073,51	5.702,15	23.534,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4	EXECUÇÃO DE LAJE FIXA PARA FIXAÇÃO DIRETA	2.504.177,75	1.817.683,72	415.554,92	1.561.706,39	1.794.997,76	7.609,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.5	EXECUÇÃO DE LAJE FLUTUANTE DO SISTEMA DE ATENUAÇÃO	-	-	18.749,32	-	92.427,45	32.427,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	REDE AÉREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS	-	-	-	101.536,96	288.292,44	251.053,49	97.985,36	113.377,44	206.741,62	5.079,80	401.817,60	97.986,64	-	-	-	
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FIOS E CABOS	-	-	-	-	40.569,80	-	(18.504,76)	-	11.788,18	-	-	6.023,34	-	-	-	
6.3	IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO	19.437,86	-	48.594,64	153.660,46	876.644,95	180.118,35	124.877,76	16.693,36	61.657,58	348.604,13	-	446.628,09	579.388,50	1.199.762,00	-	
6.4	TESTES - ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL MENSAL	10.941.128,51	16.209.742,84	13.246.402,01	8.416.918,70	12.453.934,24	5.917.059,46	4.685.249,93	1.352.212,94	583.251,28	3.352.290,59	601.981,60	1.006.318,52	985.122,14	2.895.859,47	344.632,13	
	TOTAL ACUMULADO	349.269.158,63	365.478.901,47	378.725.303,48	387.142.222,18	399.596.156,42	405.513.215,88	410.198.465,81	411.550.678,75	412.133.930,03	415.486.220,62	416.088.202,22	417.094.520,74	418.079.642,88	420.975.502,35	421.320.134,48	421.664.766,61

Jackson Teixeira Eugênio
 Gerente de Obras Civis
 Expansão Linha - 13

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2

TERMO ADITIVO NR 7

CONTRATADA: CONSORCIO CST LINHA 13 JADE - LOTE 2 - CONTRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

Data Base: agosto/2013

DESCRIÇÃO		MÊS 65	MÊS 66	TOTAL (R\$)
LOTE 2				
1	CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS			
2	CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS - 2 CANTEIROS	54.142,90	321.839,54	18.723.486,34
3	SISTEMAS ELETRÔNICOS			14.301.825,64
3.1	SUBSISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO DE OBRAS ON-LINE			-
4	ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS			-
4.1	SERVIÇOS ESPECÍFICOS			3.576.230,43
	PLANO DE COMISSIONAMENTO - ENTREGA E APROVAÇÃO			-
	COMISSIONAMENTO			-
4.2	PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE			7.798.959,64
4.3	MEIO AMBIENTE			-
4.3.1	REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E EFLUENTES			1.235.446,96
4.3.2	MANEJO DE VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS			1.302.545,39
4.3.3	PLANTIO COMPENSATÓRIO E MANUTENÇÃO, INCLUSIVE RELATÓRIOS			355.527,89
5	VIA PERMANENTE			-
5.1	VIA PERMANENTE - ELEVADO			-
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			7.049.415,00
5.1.2	FUNDAÇÕES			64.478.316,75
5.1.3	MESOESTRUTURAS			48.310.045,85
5.1.4	ESTRUTURAS			210.437.183,86
5.1.5	ISOLAMENTO ACÚSTICO			354.566,16
5.1.6	DRENAGEM			3.934.073,33
5.1.7	BANDEJAMENTO			6.423.990,49
5.2	VIA PERMANENTE - SUPERESTRUTURA			-
5.2.1	SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA	290.469,24		8.601.620,74
5.2.2	VIA PERMANENTE - FORNECIMENTO DE MATERIAS			2.915.204,30
5.2.3	EXECUÇÃO DE LAJE DE REGULARIZAÇÃO			416.392,36
5.2.4	EXECUÇÃO DE LAJE FIXA PARA FIXAÇÃO DIRETA			15.247.719,87
5.2.5	EXECUÇÃO DE LAJE FLUTUANTE DO SISTEMA DE ATENUAÇÃO			1.220.099,76
6	REDE AÉREA			-
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS			1.563.881,35
6.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FIOS E CABOS			39.876,56
6.3	IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO			4.044.857,62
6.4	TESTES - ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA			-
TOTAL MENSAL		344.632,14	321.839,54	422.331.266,29
TOTAL ACUMULADO		422.009.398,75	421.247.371,89	

Jackson Teixeira Eugênio
Gerente de Obras Cívis
Expansão Linha - 13

AD RP VP
AB
ML

ANEXO 2**TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO CONTRATO Nº 851612001101****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: CONSÓRCIO CST LINHA 13 - JADE - LOTE 02

CONTRATO Nº: 851612001101 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 07

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 02.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:


- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.


2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:


PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4

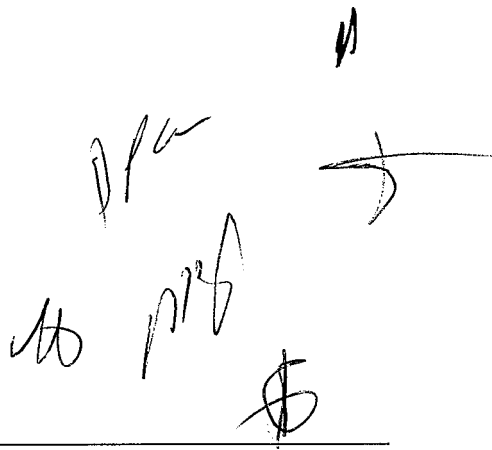



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO CONTRATO Nº 851612001101, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E O CONSÓRCIO CST LINHA 13 - JADE - LOTE 02.

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

RODRIGO SERGIO DIAS
Diretor Administrativo e Financeiro
rodrigo.dias@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 225.510.368-01
RG nº: 39.561.246-9

DIOGO PERES NETO
Diretor de Planejamento
diogo.neto@cptm.sp.gov.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº: 286.454.178-55
RG nº: 26.859.571-9

JACKSON TEIXEIRA EUGÊNIO
Gestor
jackson.eugenio@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 117.329.466-04
RG nº: 52.876.169-9

Pela CONTRATADA:

ALBERTO MAYER DOUEK
Representante Legal do Consórcio
albertodouek@consbem.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 073.062.738-17
RG Nº: 10.314.971-5

RICARDO BELLON JUNIOR
Representante Legal do Consórcio
ricardo.bellon@tiisa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 588.370.437-91
RG Nº: 04.545.559-9

PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4

MARCELO JOSE BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 025.077.968-47
RG nº: 4.621.958-4

THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO
Representante Legal do Consórcio
secretaria.presidente@serveng.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 006.249.538-07
RG Nº: 3.837.244-7

JUAREZ BARCELLOS FILHO
Representante Legal do Consórcio
juarez.barcellos@tiisa.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 667.117.387-72
RG Nº: 4002292
